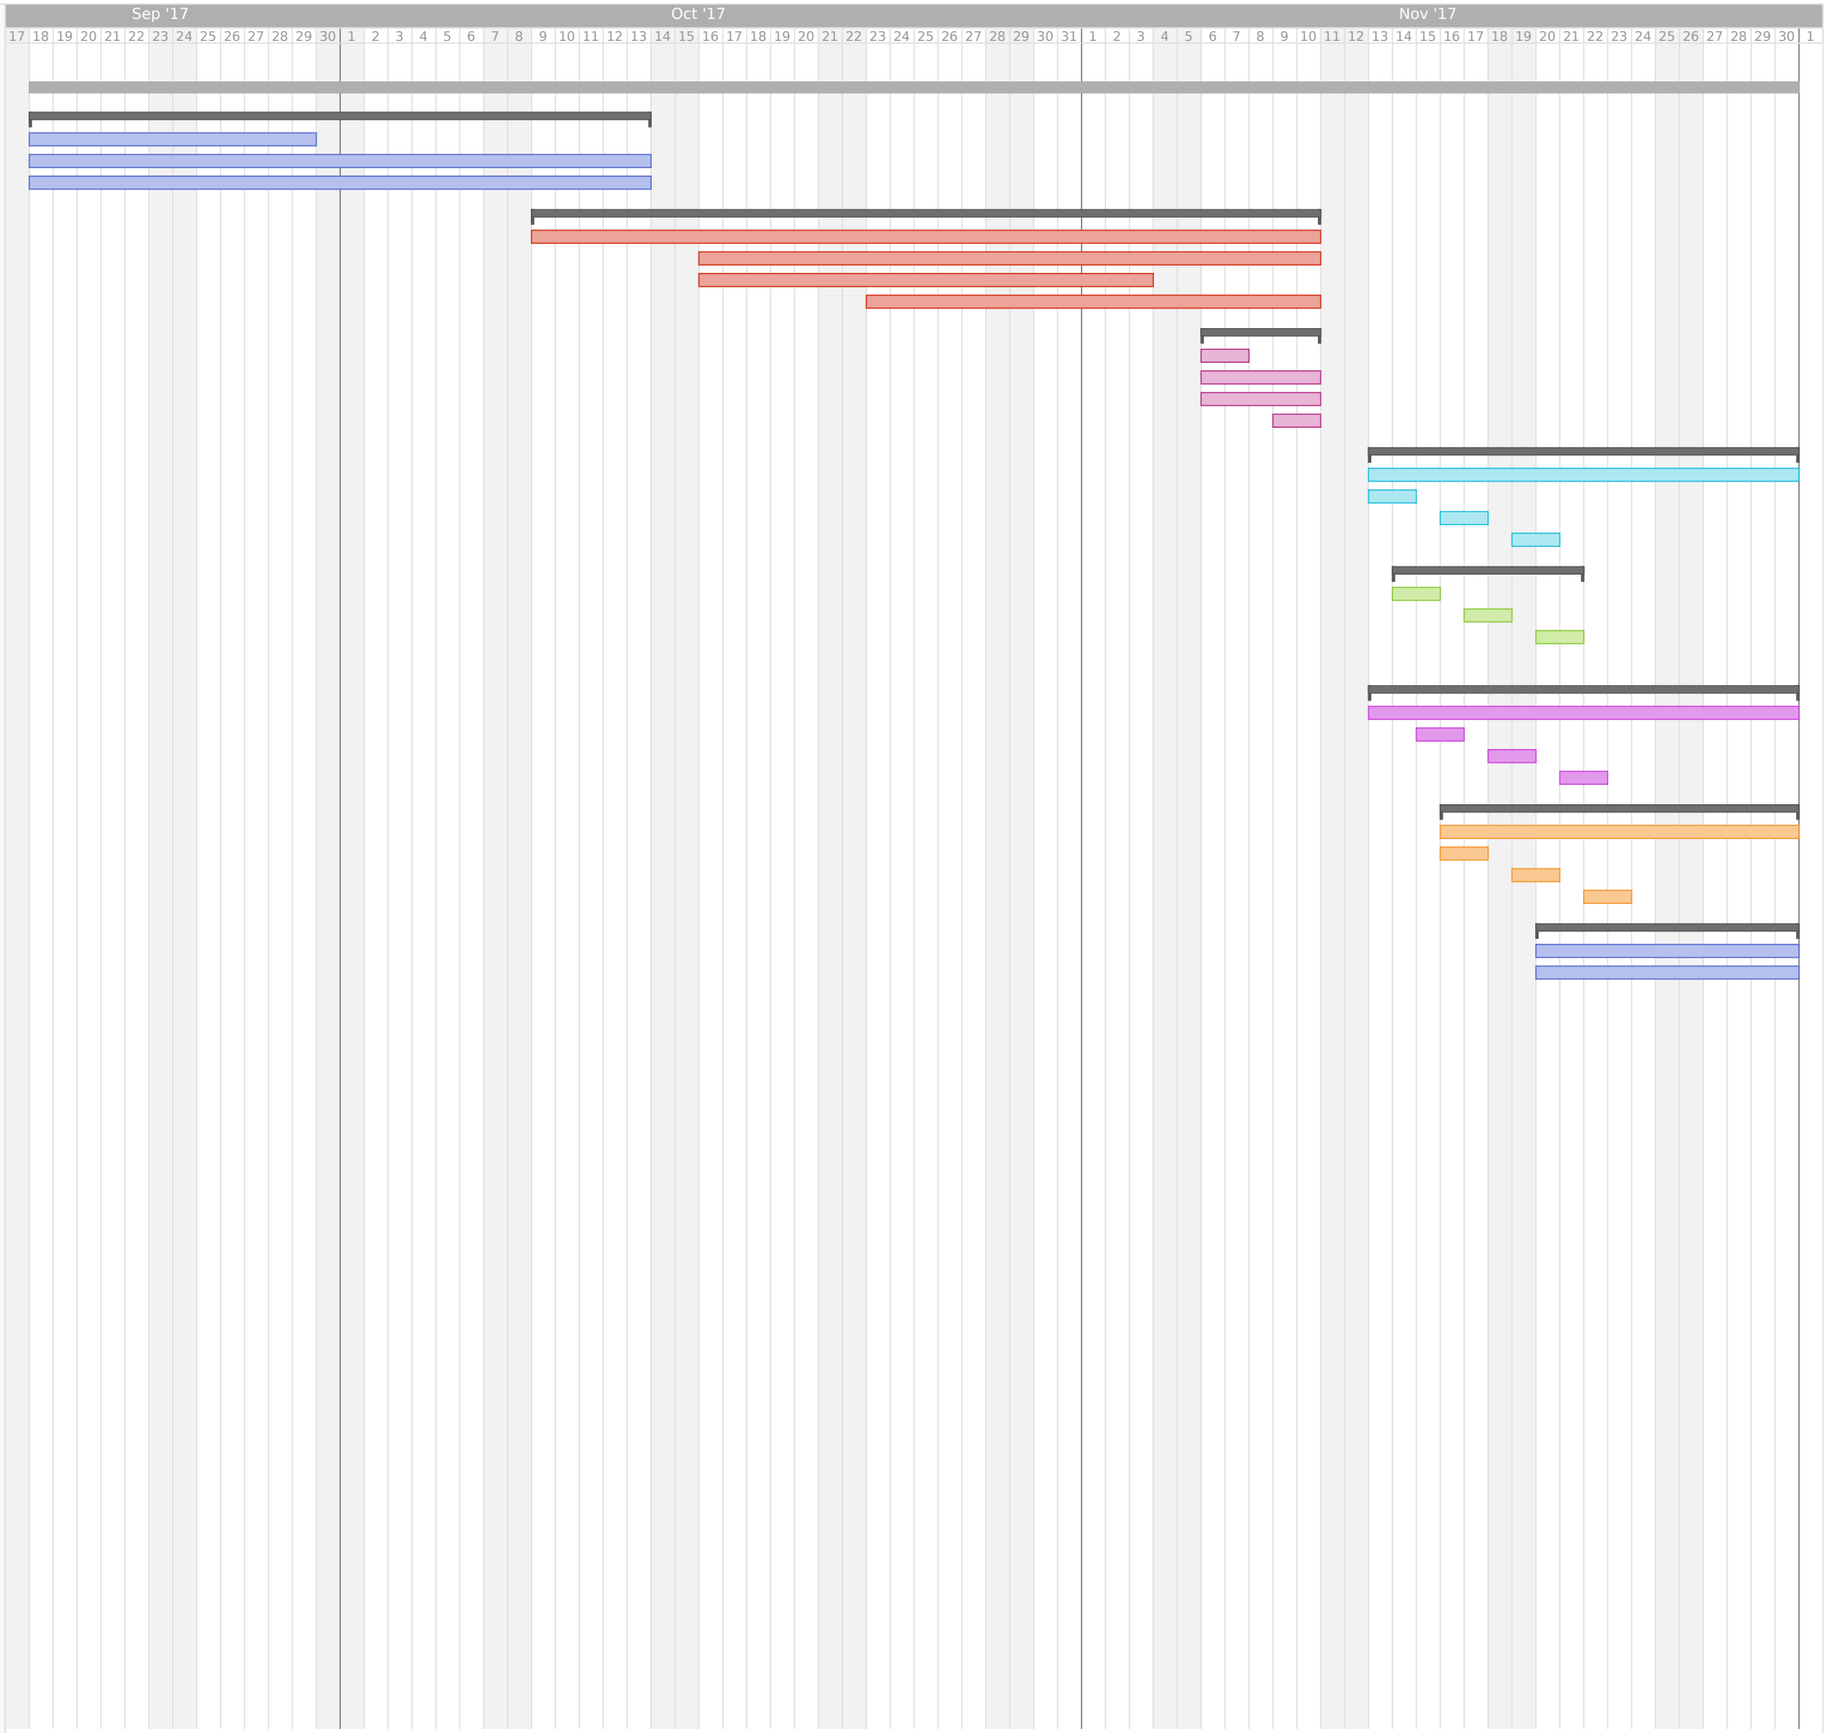Hull 2017 Build Up	start	end	0h	0%
Documentation	**18/09/17**	**13/10/17**	**0h**	**0%**
Site Plans & Renders	18/09	29/09	0	0%
System Diagram	18/09	13/10	0	0%
Artwork Set Ups	18/09	13/10	0	0%
Fabrication and Maintenance	**09/10/17**	**10/11/17**	**0h**	**0%**
Robo Traders (Robot Testing and Wri...	09/10	10/11	0	0%
The White Wall (Plinth Structure)	16/10	10/11	0	0%
Contracts Engineering (Fences)	16/10	03/11	0	0%
Fish Fabrications (End Effectors)	23/10	10/11	0	0%
Provisional Works	**06/11/17**	**10/11/17**	**0h**	**0%**
R J Turnbull (Museum Quarter Ground...	06/11	07/11	0	0%
Hull 2017 (Parking Restrictions / Flag...	06/11	10/11	0	0%
Noba (Wireless Network Installation)	06/11	10/11	0	0%
JBS (Museum Quarter Fencing/Marki...	09/11	10/11	0	0%
The Whitewall (Plinth/Structure)	**13/11/17**	**30/11/17**	**0h**	**0%**
Onsite Support (Fencing, MEWP)	13/11	30/11	0	0%
Beverley Gate	13/11	14/11	0	0%
Trinity Square	16/11	17/11	0	0%
Museum Quarter & Wilberforce	19/11	20/11	0	0%
Power Logistics (Generators & Dist...	**14/11/17**	**21/11/17**	**0h**	**0%**
Beverley Gate	14/11	15/11	0	0%
Trinity Square	17/11	18/11	0	0%
Museum Quarter & Wilberforce	20/11	21/11	0	0%
Onsite Support (Testing and Sign Off)	-	-	0	0%
Robo Traders (Robots)	**13/11/17**	**30/11/17**	**0h**	**0%**
Onsite Support (Lifting Assistance)	13/11	30/11	0	0%
Beverley Gate	15/11	16/11	0	0%
Trinity Square	18/11	19/11	0	0%
Museum Quarter & Wilberforce	21/11	22/11	0	0%
HSL (Lighting and Audio)	**16/11/17**	**30/11/17**	**0h**	**0%**
Onsite Support (Lifting Assistance)	16/11	30/11	0	0%
Beverley Gate	16/11	17/11	0	0%
Trinity Square	19/11	20/11	0	0%
Museum Quarter & Wilberforce	22/11	23/11	0	0%
Jason Bruges Studio (Control)	**20/11/17**	**30/11/17**	**0h**	**0%**
Control Implementation	20/11	30/11	0	0%
Content Implementation	20/11	30/11	0	0%
